STE
PERAWATAN SERAT OPTIK 1 BULANAN

TRA11902 : OTB 9 ER CILEBUT

TRA11814 : OTB 10 ER CILEBUT

TRA11884 : OTB 6 ER CILEBUT

TRA11891 : OTB 7 ER CILEBUT

TRA11897 : OTB 8 ER CILEBUT

Lokasi	**:**	**Cilebut**	**Disetujui oleh**	**:**	**FURQON SUSILO WARDOYO**	**Diketahui oleh**	**:**	**EKO MUJIANTO**
Tanggal	**:**	**2025-05-05**	**NO. SC.**	**:**	**PRP.090190.126696**			
Periode Perawatan	**:**	**Bulanan**	**Dilaksanakan oleh:**	**:**	**AGUS PRIYONO** **DEDI SURYADI** **IWAN SETIAWAN** **SADDAM YUSUF FATHIR** **DONI FREDIANSYAH**	**NO. SC.**	**:**	**PRP.030886.126116** **PRP.181271.126074** **PRP.03071990.36476** **PRP.181002.72321** **PRP.291288.00136**

No	**ITEM PERAWATAN**		**REFERENSI STANDAR**	**HASIL**				
	Nomor Aset			**TRA11902**	**TRA11814**	**TRA11884**	**TRA11891**	**TRA11897**
1	Nama ODF/OTB							
	1.1	Nama ODF/OTB	Nama ODF/OTB	OTB 9	OTB 10	OTB 6	OTB 7	OTB 8
	1.2	Jumlah Core	Sesuai dengan Serat Optik yang ada di ODF/OTB	12	24	12	12	120
2	ODF (Optical Distribution Frame) atau OTB (Optical Termination Box)							
	2.1	Perawatan kebersihan peralatan dan ruangan	Peralatan dan ruangan bersih serta terawat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	2.2	Mounting ODF/OTB	Kokoh dan Kuat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	2.3	Bracket ODF/OTB	Kokoh, kuat dan rapi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	2.4	Tutup pengaman jalur keluar masuk	Tidak menjepit dan rapi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kabel Patchcord							
	3.1	Kabel Patchcord	Bersih dan terawat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	3.2	Kondisi kabel patchcord	Tidak terkelupas, tidak terjepit dan rapi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	3.3	Ketersediaan label	Label ada dan jelas	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	3.4	Posisi kabel	Tidak bengkok dan rapi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Konektor dan Adapter							
	4.1	Pengencangan konektor	Kencang dan rapi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	4.2	Pengencangan adapter	Kencang dan rapi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	4.3	Kondisi port Adapater yang kosong	Tertutup dengan rapi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Pengukuran kabel serat optik							
	5.1	Kabel serat optik sesuai dengan jarak	Jarak ukur sesuai	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	5.2	Nilai redaman serat optik yang tidak terpakai	Redaman per KM (0.35 dB)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	5.3	Posisi kabel serat optik	Tidak bending	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	5.4	Pengukuran dengan cahaya	Cahaya sampai tujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	5.5	Nilai redaman tiap core	Redaman rendah dan jarak ukur sesuai	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

[V] = BAIK [X] = TIDAK BAIK [-] = TIDAK ADA [.....] = ANGKA (NILAI) ATAU HURUF

NO	**KEGIATAN**	**KETERANGAN**

1	Hasil Penilaian (Baik/Tidak Baik)	Baik
2	Penggantian Komponen/Elemen	-
3	Identifikasi masalah (berisi masalah khusus yang ditemukan dilapangan pada saat pemeriksaan, dan memerlukan penanganan lebih lanjut)	-
4	Rencana tindak lanjut masalah pada butir 3	-

Lembar Pemeriksaan sah walaupun tanpa tanda tangan karena telah disetujui secara elektronik menggunakan aplikasi **P3STE Mobile** oleh **FURQON SUSILO WARDOYO 64465 Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik Kelas B 1.21 Bogor**	**Disetujui Oleh:** **FURQON SUSILO WARDOYO**

FOTO DOKUMENTASI

PERAWATAN SERAT OPTIK 1 BULANAN BOGOR

05 Mei 2025

TRA11902 : OTB 9 ER CILEBUT

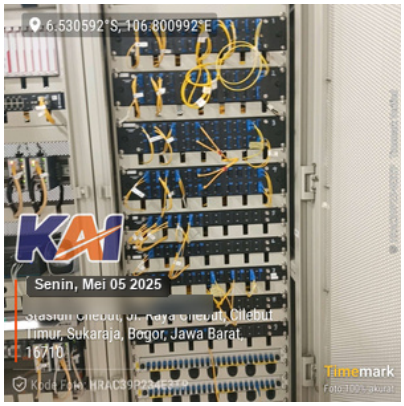


Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%
